



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR DP 1.03 / 330
ADRES INSTALLATIE: A De Winklerstr
bus 1 2840 Rumst
EIGENAAR: Van Nuffel
Adres: Woorloosdijk 103 2570
OPDRACHTGEVER: idem
Adres: idem
INSTALLATEUR: idem
Adres:
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALL.

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 24/11/2003 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: Huishoudelyk
Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met- Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting: Spanning 3 x 400 / 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40
Netaftakkabel: type: bestaand mm² Voedingskabel hoofdbord: type: EVAUB 2x10
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; RA: 10,5 Ohm; RI tot: >100 M

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40A / Δ0,3A : 3B A → K
ADS 40A / Δ0,03A : 3B 1 → K

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - nee
NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde


4. BESLUIT De installatie is - niet- conform. De algemene ADS - was- werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2003 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag - niet- in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER naam + handtekening

CONTOLEORGANISMIJL
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
J. DE PAUW

Fendroad schema : renoverre appartement Antoine de Winterskroot 3

Bus 1
2840 Ruimt

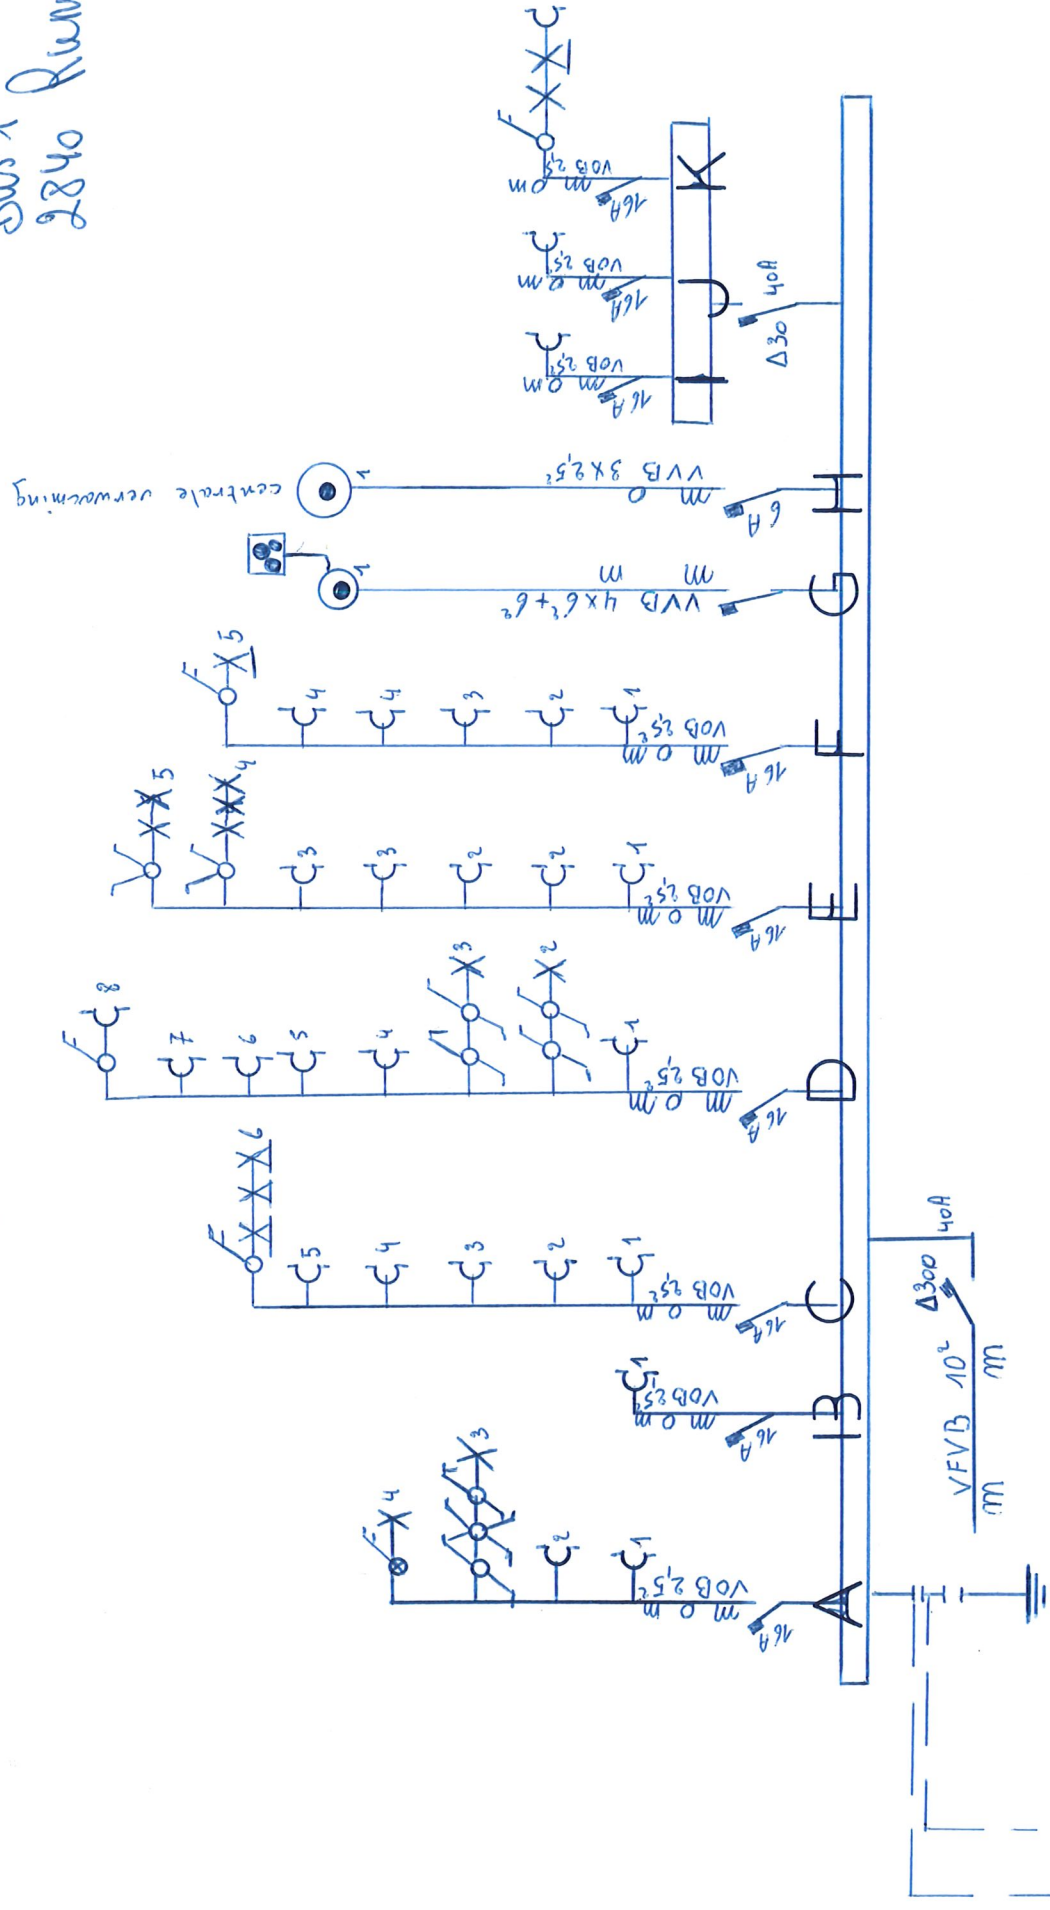


KUNTMOLEUTENRAIJSWML
ATK VZW
 2820 BONHEIDEN
 Agent-Underzoeker
 J. DE PAUW
 24 NOV. 2003

De afgevaardigde van het
 erkend organisme
 Handtekening
 Datum

De verantwoordelijke voor de
 uitvoering van het werk
 Handtekening
 Datum

Situatieschema: renovatie appartement
 Antoine de Winterschaat 3 Bus 1
 2840 Rumst

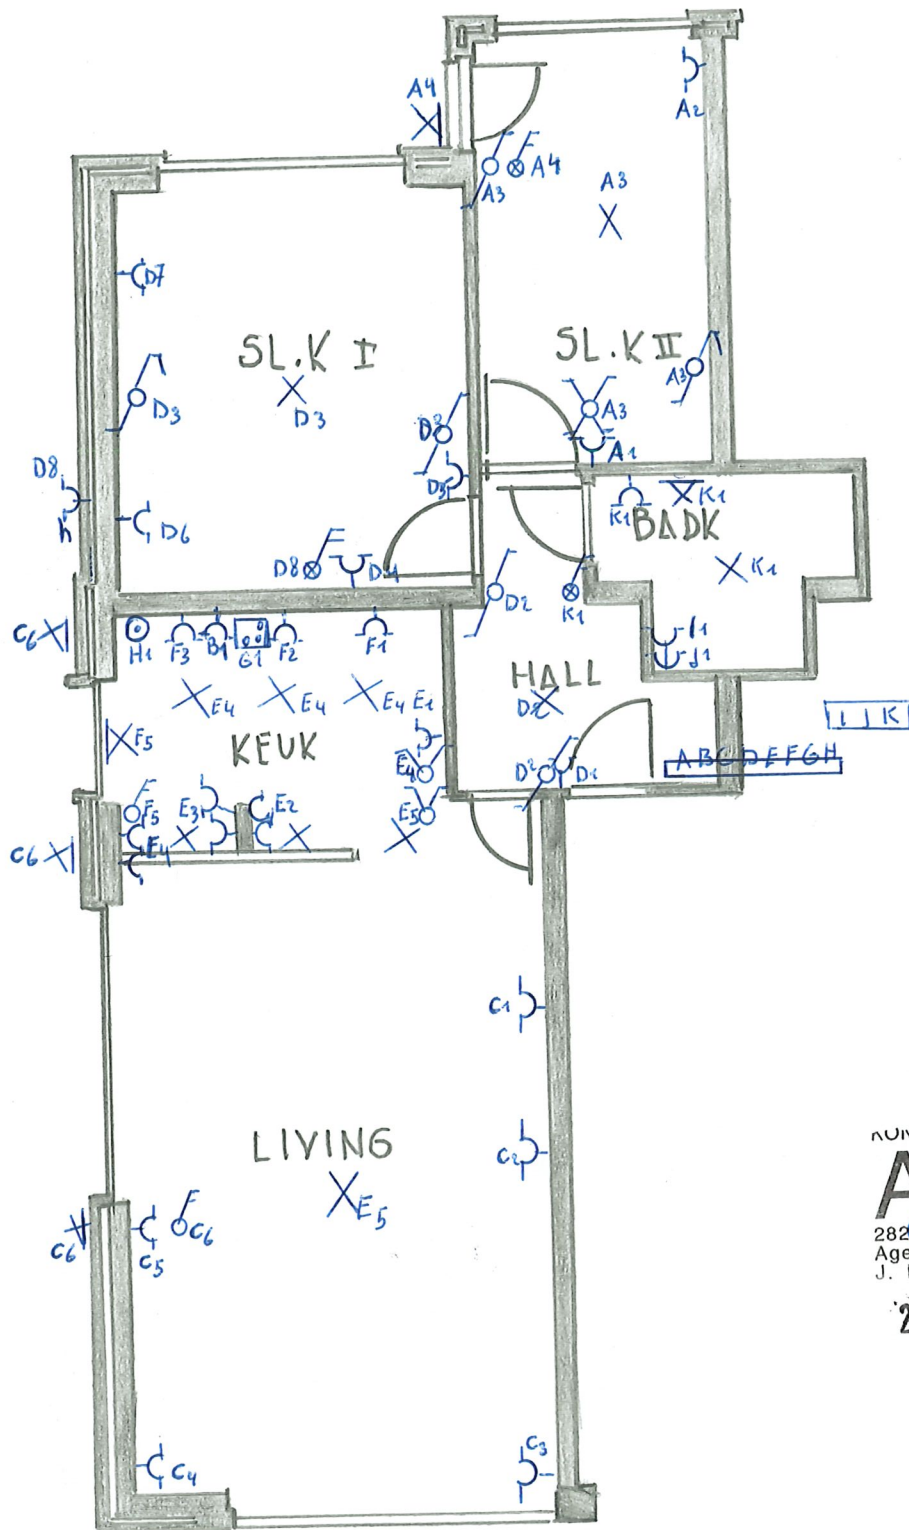

CONTROLEORGANISME

ATK VZW

2820 BONHEIDEN
 Agent- Onderzoeker
 J. DE PAUW

24 NOV. 2003

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk.
 Handtekening
 Dakem

